



SIGAA

Plan de trabajo y calendario de entregas

Responsabilidades, hitos y control de Capstone PTY4614

SEMANA ACTUAL: 3 DE 18

Equipo

Joel Lopez | Agustin Sorolla | Matias Martinez

Proyecto: Sistema Integral de Gestion Academica y Alertas Tempranas

Version ejecutiva - 25 de agosto de 2026



1. Lectura ejecutiva

SIGAA esta adelantado tecnicamente para la semana 3: existe un prototipo navegable con roles docente y estudiante, arquitectura, modelo de datos y despliegue Docker. La prioridad inmediata no es agregar alcance, sino cerrar una entrega de Fase 1 consistente, verificable y visible para el profesor.

PROYECTO

BIEN

Alcance escolar definido

PROTOTIPO

FUNCIONAL

Docente + estudiante

FASE 1

EN CIERRE

Datos y validacion pendientes

REPOSITORIO

RIESGO

main y README incorrectos

Decision del Product Owner


DECISION	RECOMENDACION	FECHA LIMITE
Alcance Fase 1	Congelar el MVP escolar actual. No incorporar nuevos modulos antes de la sumativa.	26 ago
Repositorio	Hacer visible SIGAA en la rama que revisara el docente y corregir el README raiz.	27 ago
Sprint 0	Aprobar o devolver formalmente el cierre.	27 ago
Roles	Ratificar Scrum Master y responsables tecnicos.	28 ago

Regla de control: ningun estado se considera terminado sin evidencia en GitHub, prueba reproducible y aprobacion correspondiente.



2. Mapa del semestre y evaluaciones

El ramo se divide en tres fases y cuatro evaluaciones sumativas. Las semanas marcan una ventana oficial; el día y la hora exactos deben confirmarse en Campus Virtual o con el docente.

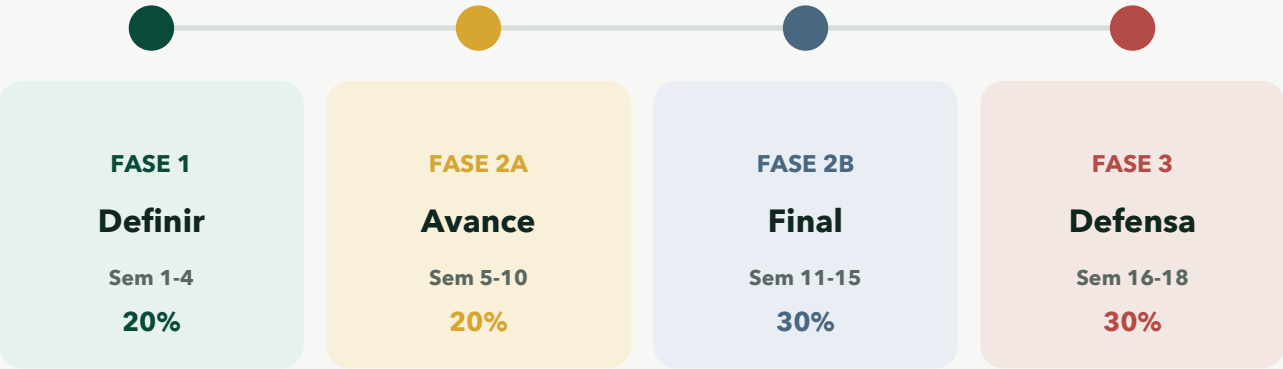

Ponderacion final

EVALUACION	VENTANA	FORMATO	PESO
Definicion Proyecto APT	Semanas 1-4	Encargo con presentacion	20%
Informe de avance	Semanas 5-10	Encargo sin presentacion	20%
Informe final	Semanas 11-15	Encargo con presentacion	30%
Defensa ante comision	Semanas 16-18	Presentacion individual/equipo	30%

Semana actual

HOY	OBJETIVO	PROXIMO HITO
Martes 25 de agosto Semana 3 de 18	Cerrar documento 1.5, evidencias individuales, Gantt, presentacion y repositorio.	Sumativa Fase 1 31 ago-5 sep



3. Calendario semanal - semanas 1 a 9

La semana 3 esta resaltada porque corresponde al corte actual. La semana 4 es la primera evaluacion sumativa.

SEM	FECHAS	TRABAJO PRINCIPAL	ENTREGA / HITO	LIDER
1	10-15 ago	Formar equipo, definir proyecto preliminar, autoevaluar competencias.	1.1 + inicio 1.2	Equipo
2	17-22 ago	Mejorar idea, relacionar perfil de egreso, definir tecnologias y cronograma.	Formativa F1	Equipo
3	24-29 ago	Cerrar objetivos, metodologia, evidencias, Gantt y autoevaluacion.	1.3 + paquete F1	Joel coordina
4	31 ago-5 sep	Presentar definicion completa y demostrar el prototipo.	SUMATIVA F1 - 20%	Equipo
5	7-12 sep	Aplicar feedback, ajustar propuesta e iniciar desarrollo.	Diario F2	Todos
6	14-19 sep	Actualizar objetivos, metodologia y cronograma; persistencia inicial.	Seguimiento	Matias + Joel
7	21-26 sep	Desarrollo del MVP y evidencias por historia.	Incremento	Todos
8	28 sep-3 oct	Integracion, autoevaluacion y pruebas de avance.	Autoevaluacion F2	Matias coordina
9	5-10 oct	Congelar avance, ejecutar pruebas y preparar informe.	Formativa avance	Equipo

Criterio de salida de la semana 4

Documento 1.5 completo, presentacion ensayada, evidencias individuales validadas, prototipo demostrable y repositorio visible desde el enlace informado al profesor.



4. Calendario semanal - semanas 10 a 18

La segunda mitad del semestre exige convertir el prototipo en una solución persistente, probada, documentada y defendible por cada integrante.

SEM	FECHAS	TRABAJO PRINCIPAL	ENTREGA / HITO	LIDER
10	12-17 oct	Entregar informe de avance sin presentación.	SUMATIVA - 20%	Joel entrega
11	19-24 oct	Aplicar retroalimentación y reajustar backlog.	Seguimiento	Agustín coordina
12	26-31 oct	Completar persistencia, autenticación y flujos prioritarios.	Incremento	Todos
13	2-7 nov	Pruebas integrales, seguridad y rendimiento.	Evidencias técnicas	Matías coordina
14	9-14 nov	Cerrar funcionalidades, manuales e informe final.	Candidato final	Todos
15	16-21 nov	Entregar informe final y presentar resultados.	SUMATIVA - 30%	Equipo
16	23-28 nov	Aplicar feedback y preparar defensa individual.	Formativa F3	Todos
17	30 nov-5 dic	Presentación ante comisión y respuestas técnicas.	DEFENSA - 30%	Individual/equipo
18	7-12 dic	Continuación de defensas, correcciones y cierre.	Cierre de evidencias	Joel verifica

Tres cierres obligatorios

SEMANA 10	SEMANA 15	SEMANAS 17-18
Informe de avance, evidencia funcional y ajustes de objetivos/metodología.	Informe final, sistema terminado, pruebas y manuales.	Defensa, dominio individual y repositorio activo.



5. Plan Scrum y entregables por sprint

Se propone una cadencia de dos semanas. Los roles tecnicos se mantienen como propuesta hasta que el equipo los ratifique.



Cada sprint deja Planning, Backlog, tablero, Daily, pruebas, Review, Release y Retrospective.

SPRINT	OBJETIVO	ENTREGABLE PRINCIPAL	ACEPTA
S0 - Descubrimiento	Vision, alcance, backlog, riesgos, DoD y entorno.	Linea base documental y Docker.	Joel
S1 - Diseno Fase 1	Arquitectura, datos, UML, prototipo y paquete F1.	Demo + documento 1.5 + PPT.	Joel
S2 - Persistencia	Conectar profesor y estudiante a PostgreSQL.	Datos persistentes y migraciones.	Joel
S3 - Seguridad	Autenticacion, sesiones y permisos reales.	RBAC probado.	Joel
S4 - Avance	Integracion, pruebas y reporte de avance.	Informe sumativo 20%.	Docente
S5 - Alertas	Reglas explicables, seguimiento e intervenciones.	Flujo academico completo.	Joel
S6 - Calidad	Seguridad, rendimiento, accesibilidad y evidencias.	Plan y reporte de pruebas.	Joel
S7 - Cierre	Manuales, informe final y ensayo.	Candidato final 30%.	Docente
Release - Defensa	Correcciones, demostracion y comision.	Defensa 30%.	Comision



6. Responsabilidades del equipo

Joel esta confirmado como Product Owner. Los otros roles se proponen para distribuir el trabajo y deben ratificarse en la proxima reunion.

PERSONA	ROL	RESPONSABILIDADES	EVIDENCIA
Joel Lopez	Product Owner + arquitectura	Priorizar backlog; aceptar incrementos; controlar alcance; integrar arquitectura; coordinar con docente; aprobar entregas.	Decisiones PO, ADR, Review, version candidata.
Agustin Sorolla	Scrum Master + frontend/UX Propuesto	Facilitar ceremonias; mantener tablero e impedimentos; liderar experiencia responsive; registrar Daily y Review.	Tablero, burndown, UI, actas y capturas.
Matias Martinez	Datos + calidad Propuesto	Modelar base de datos; mantener migraciones; preparar pruebas; validar integridad; reunir evidencias de calidad.	ER, diccionario, SQL, pruebas y reporte QA.
Los tres	Developers	Desarrollar, revisar codigo, documentar, probar, participar en ceremonias y dominar la presentacion.	Commits, PR, pruebas, documentos y exposicion.

Carga minima individual

Cada integrante debe dejar contribuciones comprobables en GitHub y poder explicar problema, arquitectura, datos, seguridad, pruebas, metodologia y su propia participacion.



7. Matriz RACI

La matriz evita tareas sin dueño y separa ejecucion, aprobacion y consulta.

R

Ejecuta

A

Aprueba

C

Consultado

I

Informado

ACTIVIDAD	JOEL	AGUSTIN	MATIAS	DOCENTE
Priorizar Product Backlog	A/R	C	C	I
Ceremonias y tablero Scrum	A	R	C	I
Arquitectura y decisiones tecnicas	A/R	C	C	I
Frontend y experiencia movil	A	R	C	I
Base de datos y migraciones	A	C	R	I
Pruebas y calidad	A	C	R	I
Documento 1.5 y presentacion	A/R	R	R	C
Reflexiones individuales	R	R	R	I
Aceptacion de sprint	A/R	C	C	I
Calificacion academica	I	I	I	A/R

Reglas de colaboracion

1	Toda historia tiene responsable, criterio de aceptacion y evidencia.
2	Nadie modifica directamente una entrega congelada sin acuerdo del equipo.
3	Las reflexiones individuales se escriben y validan personalmente.
4	El Product Owner acepta o devuelve; no se declara terminado por anticipado.



8. Calendario operativo inmediato

Plan de cierre desde hoy hasta el final de la semana 4. La fecha exacta de entrega no esta publicada; se conserva el 5 de septiembre como fin de la ventana oficial, sujeto a confirmacion.

DIA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SALIDA VERIFICABLE
MAR 25	Auditoria de rubrica y archivos	Joel	Matriz de brechas
MIE 26	Completar datos formales y confirmar contraparte	Joel	Portadas completas
JUE 27	Corregir README/rama y cerrar Sprint 0	Joel + Agustin	Repositorio visible
VIE 28	Revision grupal documento 1.5	Los tres	Version candidata
SAB 29	Validar evidencias individuales	Cada integrante	3 paquetes validados
DOM 30	Reserva / correcciones	Segun brecha	Contingencia
LUN 31	Congelar documento y PPT	Joel	Release F1 RC1
MAR 01	Ensayo tecnico y preguntas	Los tres	Registro de ensayo
MIE 02	Verificacion desde clon limpio	Matias	Reporte de ejecucion
JUE 03	Ensayo final y ajuste visual	Agustin	PPT final
VIE 04	Contingencia y respaldo	Joel	Hash + copia PDF
SAB 05	Fin de ventana oficial	Joel	Confirmar hora exacta

Objetivo del cierre: llegar a la semana 4 con una sola version, nombres oficiales intactos, demo reproducible y los tres integrantes preparados.



9. Paquete de entrega Fase 1

La estructura y los nombres se procesan automaticamente. No deben reemplazarse por nombres internos del equipo.

TIPO	ARCHIVO	CONTROL
Individual x3	Apellido_Nombre_1.1_APT122_AutoevaluacionCompetenciasFase1.docx	Leido y validado por autor
Individual x3	Apellido_Nombre_1.2_APT122_DiarioReflexionFase1.docx	Reflexion personal
Individual x3	Apellido_Nombre_1.3_APT122_AutoevaluacionFase1.docx	Semana 3
Grupal	1.4_APT122_FormativaFase1.docx	Feedback incorporado
Grupal	1.5_GuiaEstudiante_Fase 1_Definicion Proyecto APT (Espanol).docx	Plantilla completa
Grupal	PLANILLA DE EVALUACION FASE 1.xlsx	Copia oficial
Grupal	Presentacion Proyecto.pptx	Ensayada por los tres
Complemento	Presentacion Proyecto.pdf	No reemplaza el PPTX

Checklist de aprobacion del Product Owner

CONTROL	ESTADO ACTUAL	CONDICION DE CIERRE
Datos formales	Pendiente	RUT, docente, seccion, equipo y contraparte.
README raiz	Riesgo	Debe describir SIGAA.
Rama visible	Riesgo	El profesor debe ver evidencias desde el enlace entregado.
Reflexiones	Por validar	Aprobadas por cada autor.
Demo	Funcional	Verificada desde clon limpio.
Presentacion	Preparada	Ensayo y dominio individual registrados.



10. Riesgos, decisiones y seguimiento

El control semanal debe priorizar riesgos que afecten la nota, la trazabilidad o la posibilidad de demostrar el sistema.

RIESGO	NIVEL	RESPUESTA	DUENO
Profesor revisa main y no ve SIGAA	CRITICO	Corregir rama/README y verificar enlace anonimo.	Joel
Datos personales incompletos	ALTO	Completar antes de congelar archivos.	Cada integrante
Reflexiones no validadas	ALTO	Revision y aprobacion personal.	Cada integrante
Demo depende de datos en memoria	MEDIO	Usar dataset semilla y documentar limite.	Matias
Pruebas automatizadas bloqueadas	MEDIO	Corregir inicializacion del servidor y repetir CI.	Matias + Joel
Sobrealcance antes de Fase 1	CONTROLADO	Congelar alcance hasta Review.	Joel

Cadencia de control

DIARIO	SEMANAL	POR SPRINT	POR ENTREGA
15 min: avance, plan, bloqueo y evidencia.	Revision de cronograma, riesgos y GitHub.	Review, aceptacion PO y Retrospective.	Clon limpio, checklist, hash y respaldo.



11. Fuentes y criterio de verdad

Este plan consolida las instrucciones oficiales y el estado verificado del proyecto. Si aparecen diferencias, prevalece la instruccion directa y mas reciente del docente.

FUENTE	USO EN ESTE PLAN
2026.02_Cronograma_Capstone_PTY4614.xlsx	Fechas, semanas, actividades y evaluaciones.
Instructivo CAPSTONE 2026.pdf	Fases, ponderaciones, Scrum, GitHub, Docker y pruebas.
PLANILLA DE EVALUACION FASE 1.xlsx	70 puntos grupales, 30 individuales y criterios de logro.
Listado de documentos.xlsx	Artefactos Scrum y evidencia tecnica.
Configuracion de GitHub.mkv	Estructura automatizada, nombres y carpetas de evidencias.
Repositorio SIGAA	Estado del prototipo, modelos, sprints, Docker y brechas.

Aprobaciones pendientes

DECISION	RESPONSABLE	ESTADO
Cierre Sprint 0	Joel - Product Owner	Pendiente
Ratificacion Scrum Master	Equipo	Pendiente
Ratificacion responsable datos/QA	Equipo	Pendiente
Contraparte o establecimiento	Joel + docente	Pendiente
Fecha/hora exacta Fase 1	Docente	No publicada

Proxima accion recomendada

Cerrar hoy la lista de datos formales y manana resolver la visibilidad del repositorio. Con eso controlado, el equipo puede concentrarse en calidad de contenido, ensayo y demo.
