



Carta Gantt completa

Proyecto SIGAA - Capstone PTY4614

18 semanas | 8 sprints | 4 hitos evaluados | 58 actividades

SEMANA ACTUAL: 3

FASE 1

Semanas 1-4 | 20%

FASE 2 - AVANCE

Semanas 5-10 | 20%

FASE 2 - FINAL

Semanas 11-15 | 30%

FASE 3


Semanas 16-18 | 30%

Fechas semanales basadas en el cronograma oficial 2026.02. La hora exacta de cada entrega debe confirmarse con el docente.



Carta Gantt detallada - parte 1 de 2


Las barras muestran ejecucion planificada; los rombos representan evaluaciones. El borde rojo indica ruta critica.

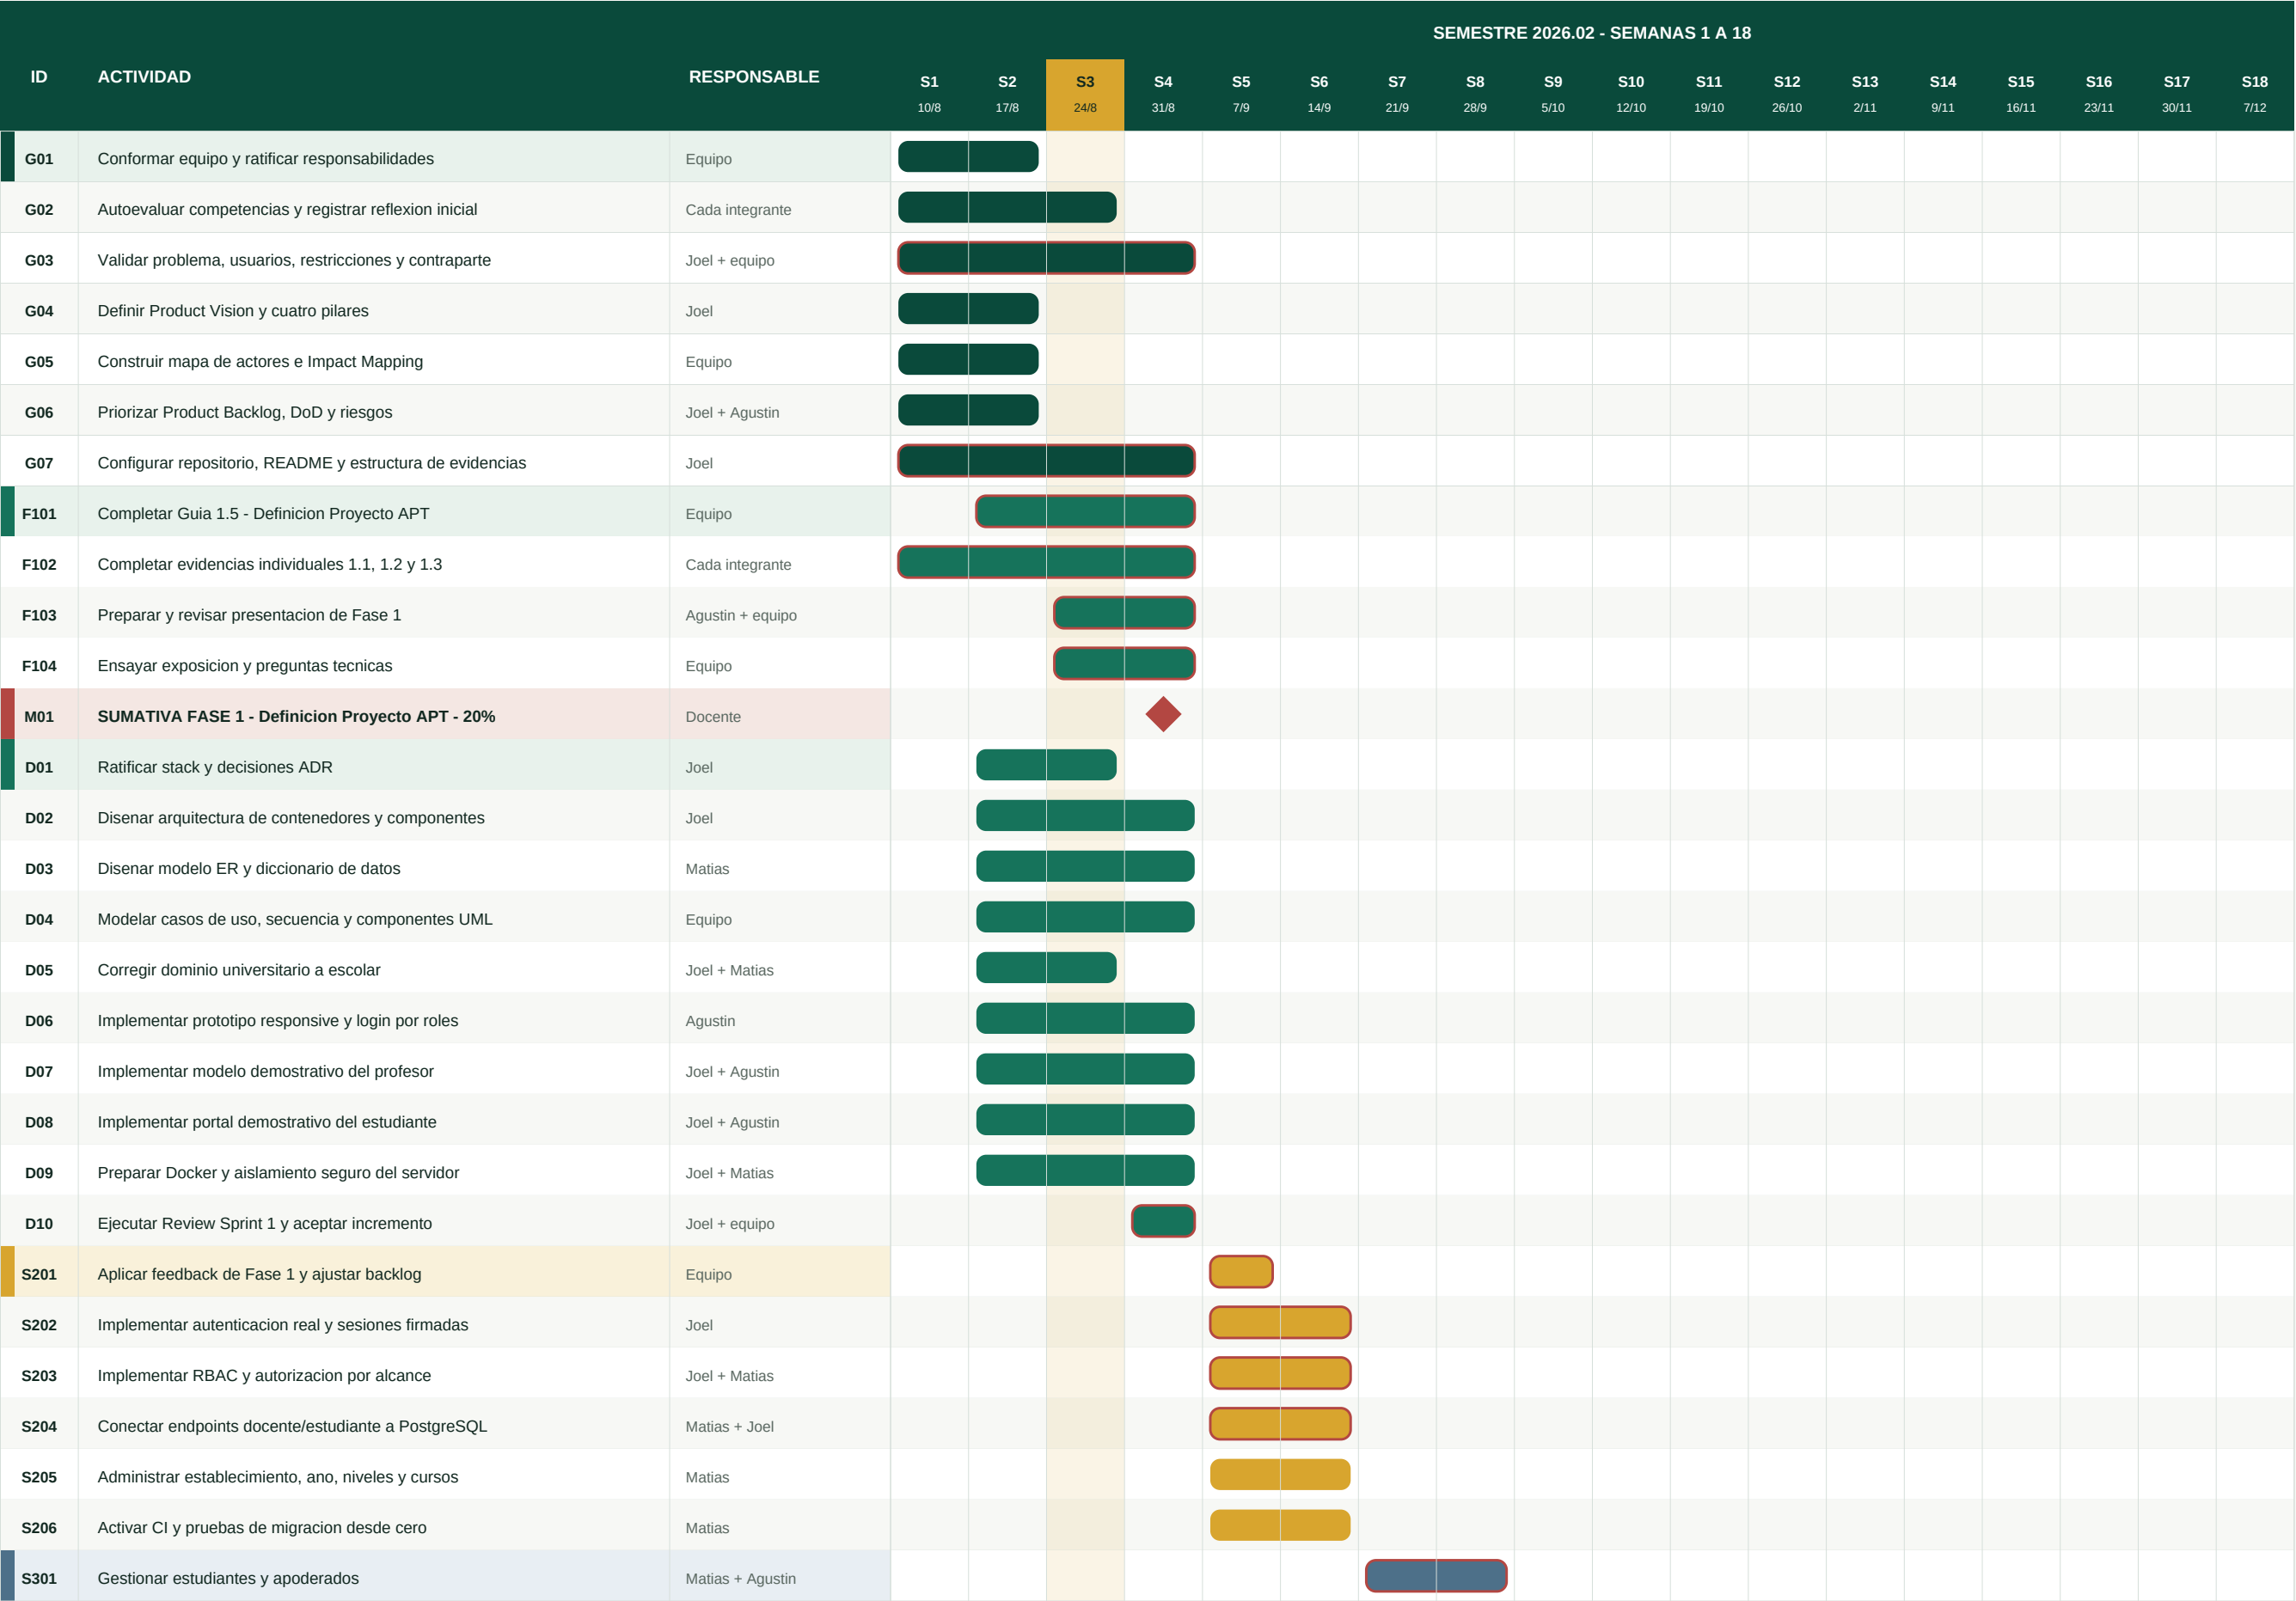



Carta Gantt detallada - parte 2 de 2


Las barras muestran ejecucion planificada; los rombos representan evaluaciones. El borde rojo indica ruta critica.

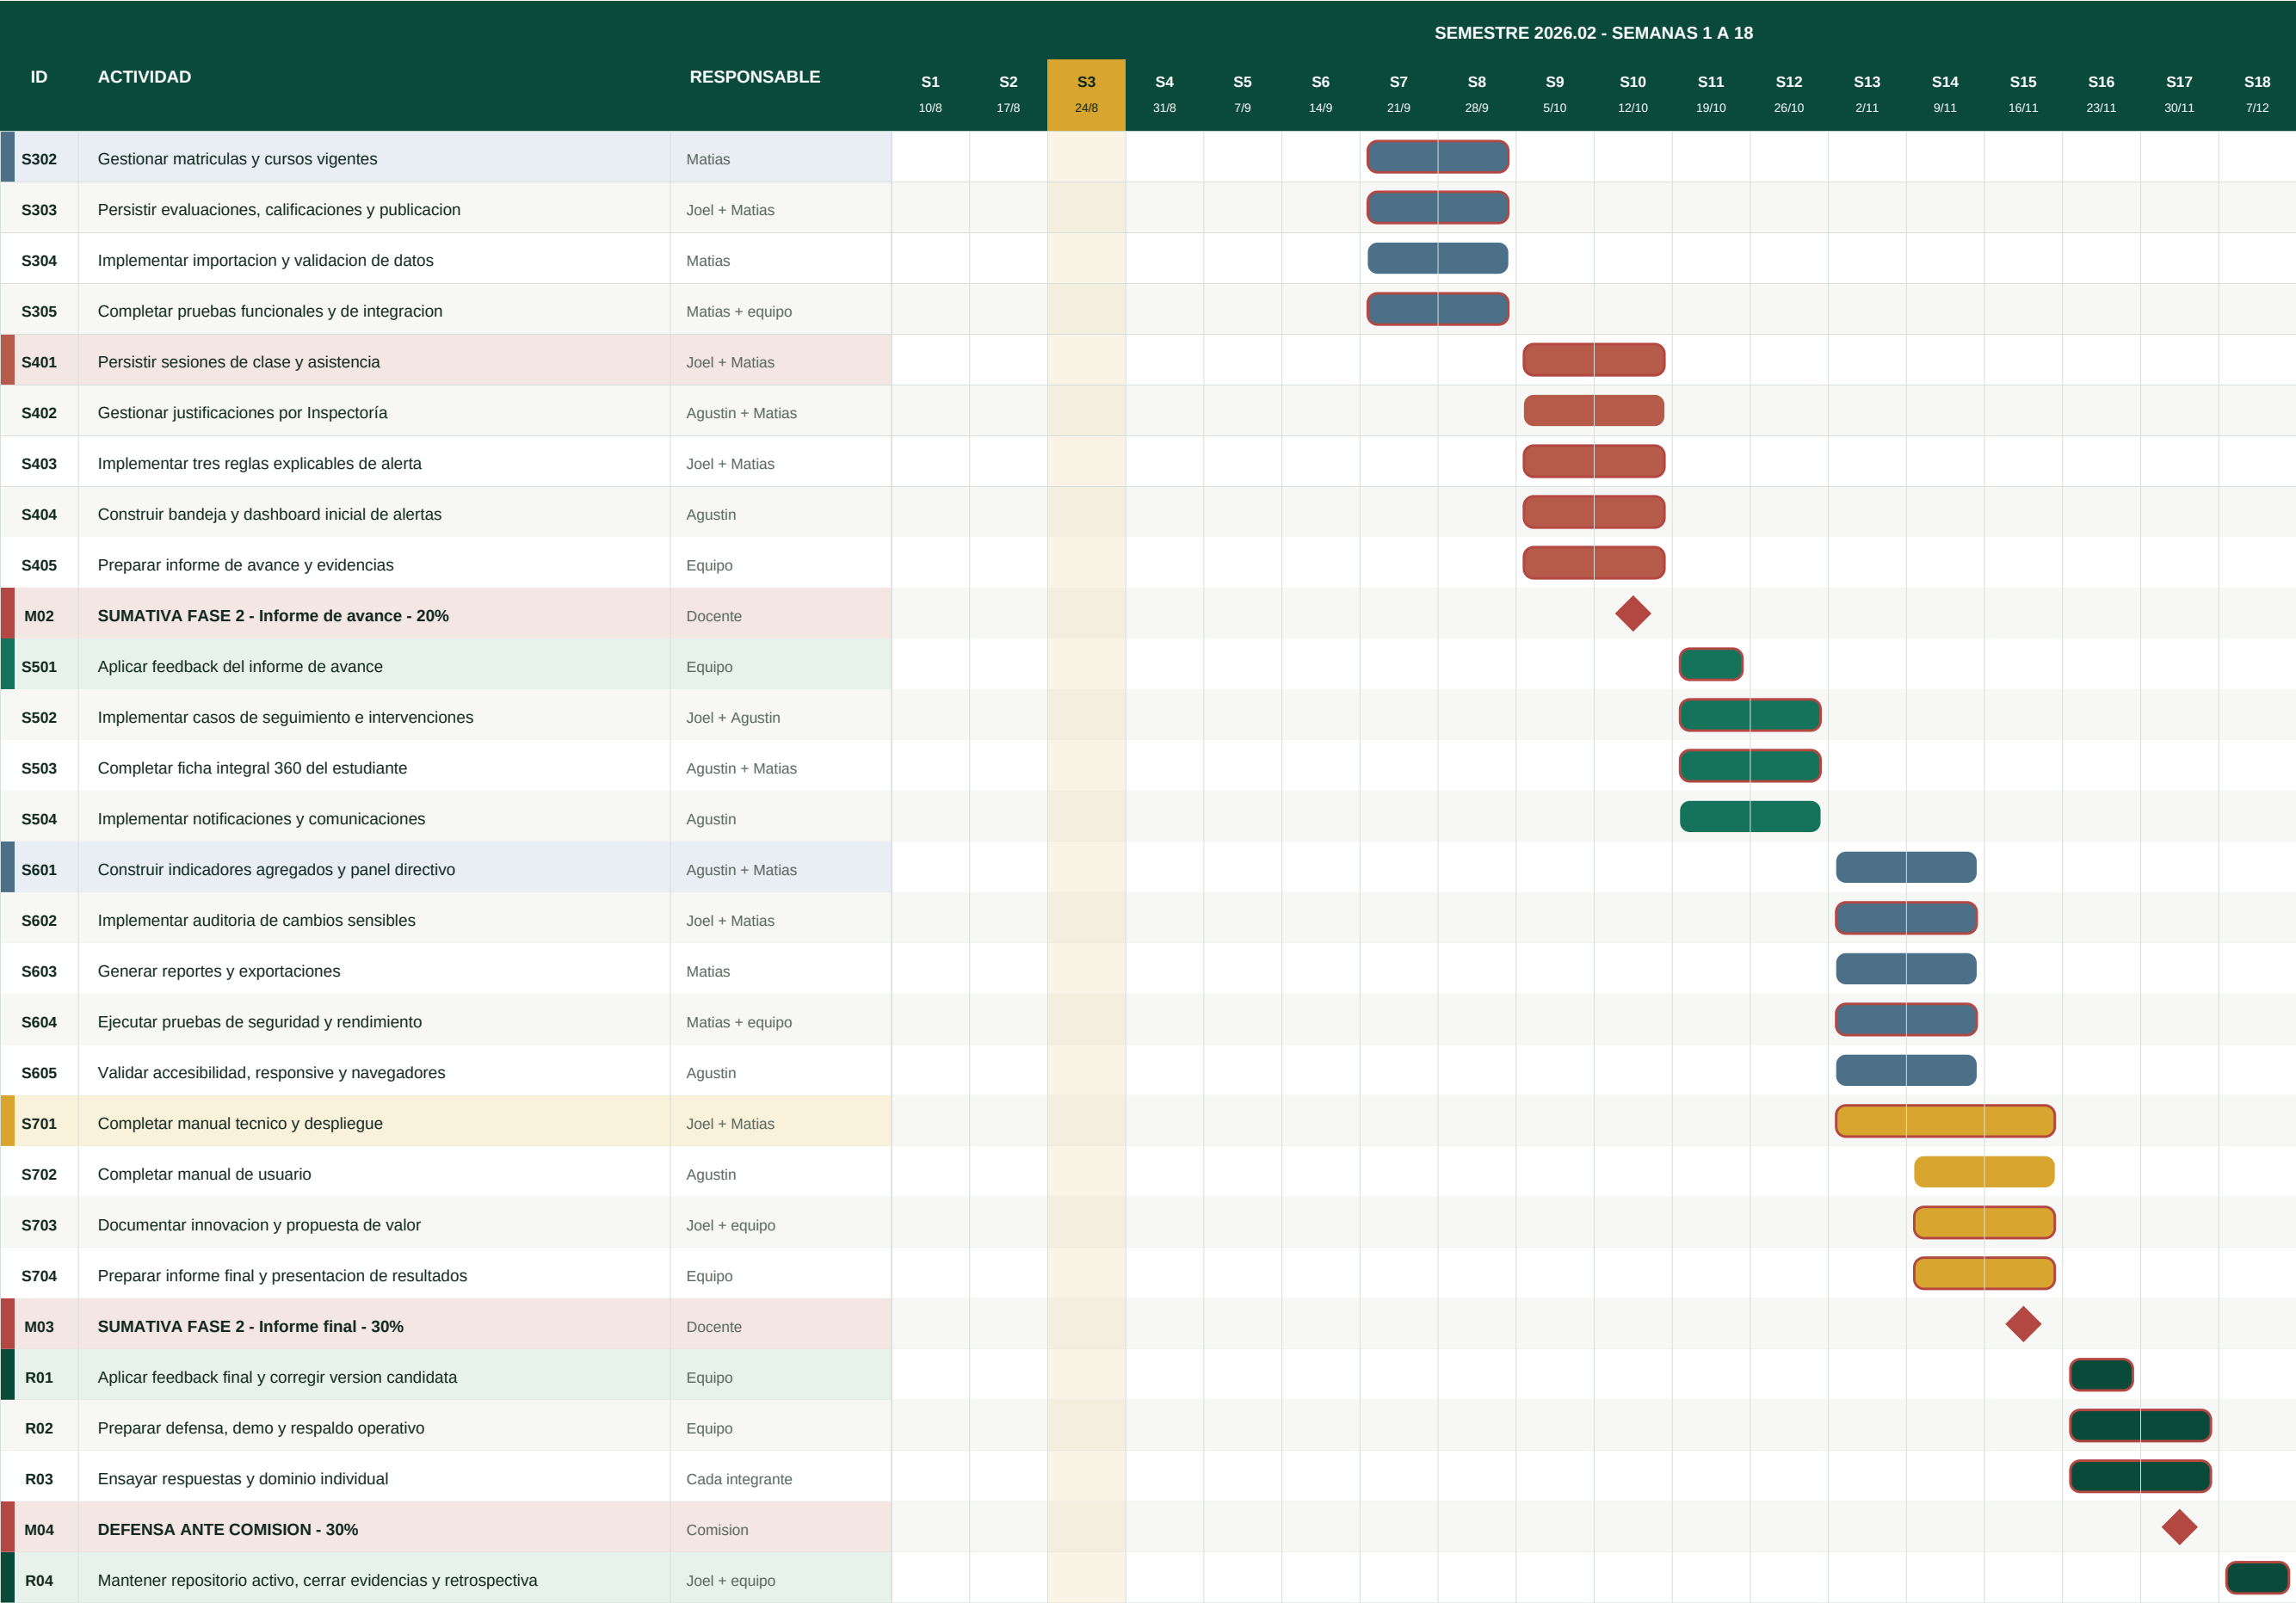



Ruta critica del proyecto

La ruta critica conecta las entregas academicas con los incrementos tecnicos que deben existir antes de cada evaluacion.



Hitos evaluados y criterios de salida

HITO	SEMANA	PESO	CRITERIO DE SALIDA	RESPONSABLE
M01	Semana 4	20%	Guia 1.5, evidencias individuales, presentacion ensayada, demo y repositorio visible.	Equipo / docente
M02	Semana 10	20%	Informe de avance, autenticacion/persistencia, gestion escolar, asistencia/alertas y pruebas.	Equipo / docente
M03	Semana 15	30%	Sistema final, seguimiento, auditoria, pruebas, manuales, informe y presentacion.	Equipo / docente
M04	Semanas 17-18	30%	Demo estable, dominio individual, preguntas de comision y repositorio activo.	Cada integrante

Responsabilidades operativas

JOEL LOPEZ
Product Owner + arquitectura
Prioriza, acepta, controla alcance, integra arquitectura y coordina entregas.

AGUSTIN SOROLLA
Scrum Master + frontend/UX (propuesto)
Facilita ceremonias, mantiene tablero y lidera experiencia web/mobile.

MATIAS MARTINEZ
Datos + calidad (propuesto)
Lidera PostgreSQL, migraciones, integridad, pruebas y evidencia QA.

EQUIPO
Developers
Desarrollan, revisan, documentan, prueban y dominan la defensa.

SUPUESTOS DE PLANIFICACION
Sprints de dos semanas; roles de Agustin y Matias pendientes de ratificacion; datos sinteticos hasta habilitar validacion externa; hora exacta de entregas pendiente del docente.
