

Informe de cierre Sprint 0 - Inception

Sistema Integral de Gestión y Acompañamiento Académico

PERIODO	10 al 22 de agosto de 2026
PRODUCT OWNER	Joel López
EQUIPO	Joel López, Agustín Sorolla y Matías Martínez
RAMA	fase-1-evidencias
RELEASE CANDIDATA	v0.1.0-inception
ESTADO	Pendiente de aprobación del Product Owner

PROPÓSITO	Presentar al Product Owner una vista verificable del trabajo ejecutado, el cumplimiento del compromiso, la deuda pendiente y la recomendación de cierre condicionado.
-----------	---

1. Resumen ejecutivo

Sprint 0 estableció la línea base de SIGAA y recuperó el atraso documental detectado durante la semana 2. Se generaron artefactos de producto, Scrum, planificación académica y arquitectura preliminar; además, se adelantó una base técnica reproducible con Docker.

De los 18 puntos comprometidos, 13 están listos para aceptación. PB-001, de 5 puntos, no puede considerarse terminada porque no existe evidencia de validación con una contraparte educativa. PB-014, entorno Docker reproducible, fue adelantada fuera del compromiso y se reporta separadamente.



DICTAMEN
PROPUESTO

Cierre condicionado: aceptar PB-002, PB-003, PB-004 y PB-005; devolver PB-001 al Product Backlog; aceptar PB-014 como trabajo adelantado sin sumarlo a la velocidad comprometida; y autorizar la transición a Sprint 1 con acciones correctivas.

2. Objetivo y criterio de cierre

Sprint Goal: crear una línea base validable con visión, actores, MVP, backlog, Definition of Done, riesgos, repositorio y evidencias.

Evaluación: parcialmente logrado. La línea base validable existe y está publicada; la validación externa que convertiría esa base en una línea base validada continúa pendiente.

Condición de cierre: el Sprint 0 no se marcará como cerrado ni se creará la etiqueta v0.1.0-inception hasta recibir la decisión explícita del Product Owner.

3. Trabajo realizado y definiciones consolidadas

ÁREA	RESULTADOS CONSOLIDADOS
Producto y descubrimiento	Product Vision y declaración de valor; problema, usuarios y beneficiarios; cuatro pilares; alcance MVP y exclusiones; mapa de actores e Impact Mapping; preguntas de validación; métricas e hipótesis.
Gestión Scrum	Product Backlog con 34 ítems y trazabilidad; Sprint Planning; Sprint Backlog; Scrumboard; registro Daily e impedimentos; Definition of Done; diez riesgos; Review; Retrospective; release candidate y planificación de Sprint 1.
Planificación académica	Revisión del instructivo, cronograma, formularios y rúbrica; definición del Proyecto APT; plan maestro con 11 hojas; carta Gantt de 18 semanas; matriz de entregables y rúbrica; infografía de sprints; base formativa en español e inglés.
Diseño técnico	ADR-001 del stack propuesto; ADR-002 de Docker aceptado; arquitectura preliminar de contenedores; módulos; modelo conceptual; secuencia principal de alertas; requisitos no funcionales iniciales.
Base ejecutable adelantada	Aplicación React/Vite servida por Nginx; API Node.js; PostgreSQL 16; Dockerfiles; Docker Compose; healthchecks; proxy interno; variables configurables; scripts de verificación para shell y PowerShell; plantilla de GitHub Actions.

Definiciones de gestión

- El alcance del MVP se concentra en gestión académica, acompañamiento, alertas y trazabilidad; las exclusiones quedan explícitas para controlar el crecimiento de alcance.
- El backlog queda priorizado con MoSCoW, estimación, sprint, responsable, dependencia y evidencia esperada.
- La Definition of Done exige implementación, prueba, documentación, evidencia y revisión antes de considerar una historia terminada.
- Docker es la base de ejecución compartida para reducir diferencias de entorno entre integrantes.
- La entrega académica y los incrementos técnicos se coordinan mediante una planificación de 18 semanas y sprints de dos semanas.

4. Cumplimiento del compromiso del Sprint 0

HISTORIA	PTS	ESTADO PROPUESTO	EVIDENCIA / OBSERVACIÓN
PB-001	5	No terminada	Falta validación externa con contraparte educativa. Debe volver al backlog y pasar a Sprint 1.
PB-002	3	Lista para aceptar	Product Vision y cuatro pilares disponibles y versionados.
PB-003	5	Lista para aceptar	Product Backlog documentado, priorizado, estimado y planificado.
PB-004	2	Lista para aceptar	Definition of Done versionada y aplicable al equipo.
PB-005	3	Lista para aceptar	Repositorio, README, estructura documental y trazabilidad publicados.

TRABAJO
ADELANTADO

PB-014 - Docker reproducible, 5 puntos. Se propone aceptarla como incremento anticipado, pero no incorporarla a la velocidad del compromiso de Sprint 0.

Lectura de métricas

El 72,2% representa historias comprometidas que cumplen la evidencia disponible para aceptación. No es una medida de productividad individual. La historia PB-001 conserva sus 5 puntos y no se fracciona, porque la validación externa forma parte central de su criterio de aceptación.

Resultado candidato

MÉTRICA	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
Compromiso	18 puntos	PB-001 a PB-005
Listo para aceptación	13 puntos	PB-002 a PB-005
No terminado	5 puntos	PB-001 por dependencia externa
Adelantado	5 puntos	PB-014 fuera del compromiso

5. Evidencia técnica, documental y de calidad

CONTROL	RESULTADO	EVIDENCIA
Versionamiento	Aprobado	Commits base 1e88b0c y 6a6b62e; cierre auditado dd22d6e; rama fase-1-evidencias.
Documentación	Aprobado	51 archivos versionados SIGAA y 22 documentos Markdown contabilizados antes del cierre.
Pruebas API	3 aprobadas / 0 fallidas	Ejecución de pruebas automatizadas del servicio API.
Build web	Aprobado	Compilación de la aplicación React/Vite completada.
Docker	3 de 3 saludables	Web, API y PostgreSQL con healthchecks operativos.
Dependencias	0 vulnerabilidades	Resultado reportado por la auditoría npm ejecutada.
Revisión funcional	Aprobada	Interfaz operativa y conexión con la base sigaa confirmada.

TRAZABILIDAD

La evidencia fuente permanece en el repositorio SIGAA: docs/scrumsprint-0, docs/arquitectura, docs/bitacora, entregables/gestion y la configuración Docker del proyecto.

Criterio de calidad aplicado

- Se distingue entre artefacto creado y artefacto aceptado por el Product Owner.
- Una dependencia externa no demostrada impide declarar PB-001 como terminada.
- El trabajo Docker se registra como adelanto para no distorsionar la velocidad comprometida.
- El informe conserva pendientes de proceso y datos institucionales; no los oculta como completados.

6. Desviaciones, deuda y riesgos de cierre

BRECHA	IMPACTO	TRATAMIENTO
Sin burndown real	No permite reconstruir la tendencia diaria del sprint.	Iniciar registro desde el día 1 de Sprint 1.
Daily consolidada	Trazabilidad operativa insuficiente.	Registrar Daily breve por jornada efectiva.
Retrospectiva sin ratificación	Acuerdos aún no asumidos por todo el equipo.	Ratificar RET-01 a RET-07 en la primera sesión.
Sin contraparte educativa	PB-001 no cumple aceptación.	Coordinar entrevista o validación formal en Sprint 1.
Datos académicos incompletos	Plantillas Fase 1 no pueden cerrarse formalmente.	Completar RUT, docente, sección y reflexiones individuales.
Roles no ratificados	Ambigüedad de coordinación y decisión técnica.	Ratificar Scrum Master y responsabilidades técnicas.
CI inactiva	Validación automática no corre en GitHub.	Habilitar permiso workflow y publicar pipeline.

RIESGO PRINCIPAL

Cerrar PB-001 sin evidencia externa convertiría una línea base validable en una supuesta validación no demostrada. Se recomienda mantener la historia abierta.

7. Transición propuesta a Sprint 1

Elementos que pasan o se activan en el siguiente sprint:

- PB-001: validar problema, usuarios, reglas y prioridades con una contraparte educativa.
- Completar datos formales y trabajo individual de Fase 1.
- Ratificar roles Scrum, responsabilidades técnicas y ADR-001.
- Activar integración continua y comprobar su ejecución en GitHub.
- Registrar Daily, puntos restantes y burndown desde el primer día.
- Avanzar arquitectura, modelo entidad-relación, UML, prototipo y presentación de Fase 1.

ACCIÓN	COMPROMISO DE MEJORA
RET-01	Mantener una Daily breve y trazable por jornada efectiva.
RET-02	Actualizar el Scrumboard y el burndown desde el inicio.
RET-03	Gestionar tempranamente la validación con contraparte educativa.
RET-04	Completar datos institucionales y aportes individuales pendientes.
RET-05	Ratificar roles y responsables técnicos.
RET-06	Activar la CI y verificar sus controles automáticos.
RET-07	Conservar evidencia por historia y aplicar la Definition of Done sin excepciones.

Cronograma general de referencia

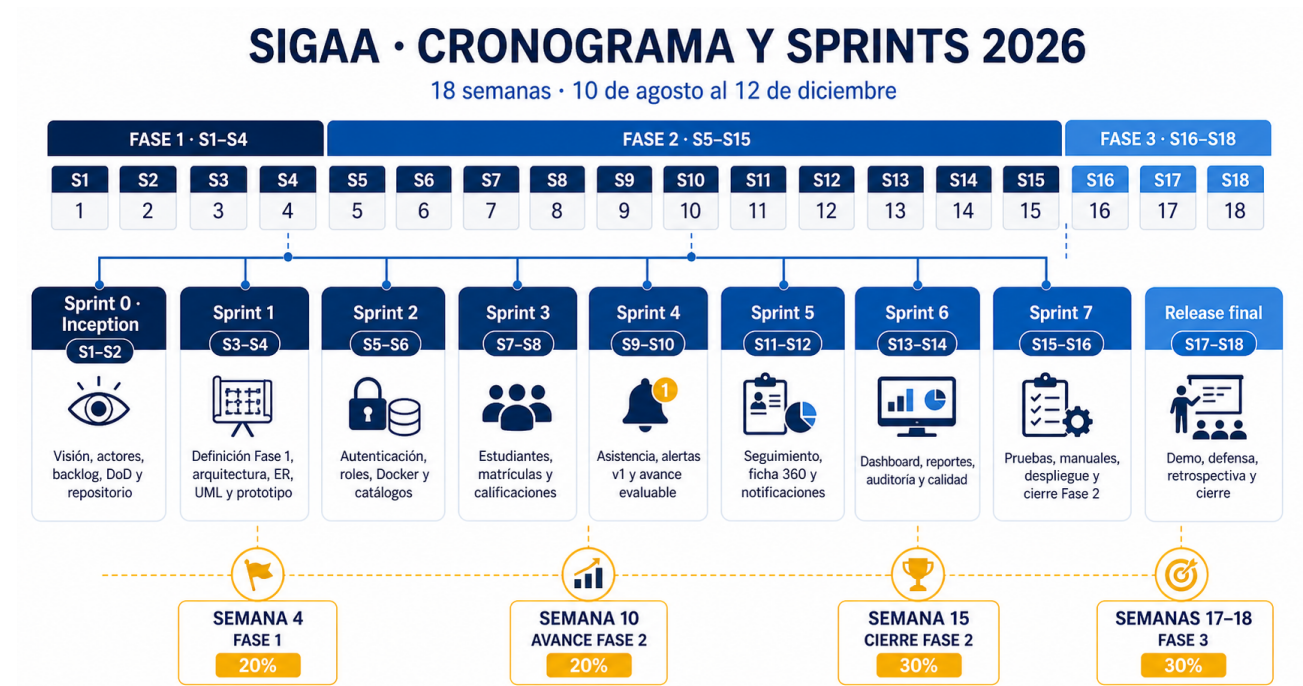


Figura 1. Cronograma y sprints SIGAA 2026. Fuente: planificación interna del proyecto.

8. Decisión del Product Owner

ESTADO ACTUAL

Pendiente de decisión. Esta página formaliza la aceptación, observaciones o rechazo del cierre candidato.

Alternativa de decisión

- ☐ Aprobado con cierre condicionado.
- ☐ Aprobado con observaciones adicionales.
- ☐ Rechazado; requiere correcciones antes del cierre.

Alcance de la aprobación recomendada

- ☐ Aceptar PB-002 - Product Vision.
- ☐ Aceptar PB-003 - Product Backlog.
- ☐ Aceptar PB-004 - Definition of Done.
- ☐ Aceptar PB-005 - Repositorio y trazabilidad.
- ☐ Aceptar PB-014 como trabajo adelantado fuera del compromiso.
- ☐ Devolver PB-001 a Sprint 1 por falta de validación externa.
- ☐ Aprobar las acciones de mejora RET-01 a RET-07.
- ☐ Autorizar el inicio de Sprint 1.
- ☐ Autorizar la etiqueta v0.1.0-inception.

Observaciones del Product Owner

Firma / validación del Product Owner

Joel López

Fecha de decisión

___ / ___ / 2026

SIGUIENTE PASO

Una vez comunicada la decisión, se actualizará el acta en el repositorio. Solo con autorización explícita se marcará Sprint 0 como cerrado y se creará la etiqueta de release.
