SIGAA

GESTIÓN ESCOLAR INTELIGENTE

DOCUMENTO 04

Burndown Chart del Sprint 4


Evolución de puntos restantes y proyección de cierre.

Periodo	Estado	Responsable de aceptación
5–17 octubre 2026	Cierre técnico; aprobación pendiente	Joel López · Product Owner

Emitido el 15 de octubre de 2026 · Fase 2, semana 10

Burndown del Sprint 4

La línea real refleja el avance comprobable y proyecta cero puntos restantes el 17 de octubre únicamente si el Product Owner aprueba PB-022.

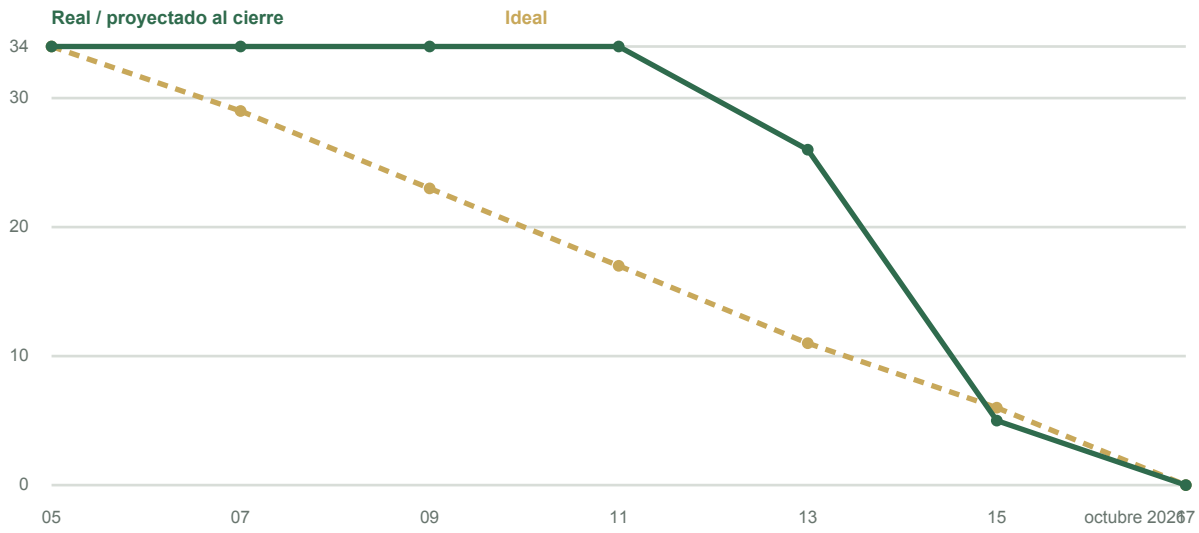

Fecha	Puntos restantes	Cambio comprobable
05-10	34	Inicio del Sprint
09-10	34	Análisis y preparación técnica
13-10	26	PB-019 terminada
14-10	10	PB-020 y PB-021 terminadas
15-10	5	PB-037 terminada; PB-022 en revisión
17-10	0 proyectado	Cierre sujeto a aprobación del PO

Interpretación: el avance se concentró al final del Sprint. La mejora acordada es dividir las historias en tareas diarias más pequeñas y actualizar el tablero el mismo día para evitar una curva plana difícil de gestionar.
